CMS del CADUS — Adenda de la entrega del 08/11/2026

Gestión de Sistemas de Información (GSI) · Universidad de Sevilla · Sprint 3 del CMS (26/10 – 15/11/2026) · estado a 01/11/2026

1. Qué se adjunta y qué cambia

El proyecto del CMS es el mismo, así que se **reutiliza el documento de la entrega 2** (Entrega2-CMS-CADUS) para la propuesta de temática, las comparativas (hosting, comunicación, SCRUM, control de versiones y plugins), el análisis, el diseño, los mockups y las capturas. Esta adenda recoge solo lo que cambia desde entonces.

Contenido pedido para el CMS	Qué se adjunta
Propuesta de temática y comparativas	Sin cambios: documento de la entrega 2
Product backlog	Mismo proyecto; actualizado en la sección 3 de esta adenda
Sprint backlog (sprint de estas semanas)	Sprint 3: sección 4
Burndown chart (solo el sprint actual)	Sprint 3: sección 5
Requisitos (REM)	REM del CMS actualizado a la versión 2.1 con las respuestas de la entrevista (CADUS.rem y REM-CADUS-v2.pdf); cambios en la sección 2
Entrevista con el cliente	Documento «Entrevista-CADUS» (adjunto)
Análisis, diseño y mockups	Sin cambios: documento de la entrega 2
Implementación	Capturas de la entrega 2; sección 6 de esta adenda

2. Cambios en los requisitos tras la entrevista con el CADUS (26/10/2026)

La entrevista con el cliente (documento «Entrevista-CADUS», adjunto) cambia el alcance del portal. El REM se actualizará en la tarea E3-05 del Sprint 3; estos son los cambios acordados:

Tabla 1. Cambios tras la entrevista

Respuesta del cliente	Cambio en el CMS	Requisitos
Las votaciones son presenciales; solo votan los delegados (un voto por delegación, con DNI) y no se publican resultados	HU-21 (papeleta online) cancelada. El portal solo anuncia la votación (HU-11); el registro de la votación pasa al DMS	RF-12, RN-05
El delegado puede dar de alta a su sucesor	Nueva HU-22: relevo de delegados (revocar al anterior, traspasar la ficha, una cuenta activa por delegación)	RF-14, RN-04
Tickets y mediaciones se conservan 2 años desde que se resuelven	Nueva HU-23: borrado o anonimización a los 2 años. Cierra el plazo pendiente	RNF-08, RN-03
Todas las consultas deben tratarse con total privacidad	RN-03 se amplía de reclamaciones y mediaciones a todas las consultas del buzón	RN-03
Todo contenido pasa por la Ejecutiva	RN-01 se amplía de actas y normativa a todo el contenido publicado	RN-01
Aviso de ticket al correo de dcadus; datos mínimos: nombre y apellidos, facultad y correo US	Tarea E3-08. El plazo de respuesta («al menos 4 días») se publica cuando se aclare si es mínimo o máximo	RF-09, RF-10, RNF-08
Calendario con asambleas y cursos	Tarea E3-07: categoría «Cursos»	RF-11
Móvil, tablet y ordenador	HU-14 incluye la tablet	RNF-02
Accesibilidad para personas ciegas o daltónicas y pautas DUA	HU-15 añade daltonismo, lector de pantalla y DUA	RNF-03
Servidor SFTP de la US y poco mantenimiento	Riesgo: WordPress necesita PHP y MySQL. Tareas E3-03 (preguntar a la US) y E3-09 (desplegar y probar)	RNF-05, RNF-07

3. Product backlog

El product backlog sigue siendo el mismo (mismo proyecto). Cambios: HU-20 pasa al Sprint 3, el antiguo Sprint 4 desaparece (un único sprint de tres semanas), HU-21 queda cancelada y se añaden HU-22 y HU-23.

ID	Historia	Requisitos	Prioridad	SP	Estado	Sprint
HU-01	Como miembro de la Ejecutiva, quiero publicar noticias categorizadas (Becas, Movilidad, Normativa, Eventos) para informar a los estudiantes.	RF-01	Alta	5	Hecho	Sprint-01
HU-02	Como Estudiante, quiero filtrar y buscar noticias por categoría, fecha y palabra clave.	RF-02	Media	3	Hecho	Sprint-01
HU-03	Como miembro de la Ejecutiva, quiero subir actas de pleno en PDF y enviarlas a aprobación antes de publicarlas.	RF-03, RF-05, RN-01	Alta	5	Hecho	Sprint-01
HU-04	Como Estudiante, quiero descargar actas y normativas en PDF organizadas por fecha y tipo.	RF-03, RF-04	Alta	3	Hecho	Sprint-01
HU-05	Como Estudiante, quiero consultar el directorio de delegaciones por Facultad/Escuela.	RF-06	Alta	5	Hecho	Sprint-01
HU-06	Como Delegado, quiero mantener actualizada la ficha de contacto y horario de mi delegación.	RF-07, RN-04	Media	3	Hecho	Sprint-01
HU-07	Como Estudiante, quiero enviar una consulta o reclamación académica desde un buzón digital y recibir un código de ticket.	RF-08, RF-09, RN-02	Alta	8	Hecho	Sprint-01
HU-08	Como Estudiante, quiero hacer seguimiento del estado de mi consulta con el código de ticket.	RF-09	Alta	5	Hecho	Sprint-01
HU-09	Como miembro de la Ejecutiva, quiero gestionar y responder tickets desde un panel, respetando la privacidad de las reclamaciones.	RF-10, RN-03	Alta	8	Hecho	Sprint-02
HU-10	Como Estudiante, quiero consultar el calendario de asambleas y eventos del CADUS.	RF-11	Media	3	Hecho	Sprint-02
HU-11	Como miembro de la Ejecutiva, quiero publicar convocatorias de votación vinculadas a una asamblea del calendario.	RF-12, RN-05	Media	5	Hecho	Sprint-02
HU-12	Como Estudiante, quiero solicitar mediación estudiantil mediante un formulario.	RF-13	Media	5	Hecho	Sprint-02
HU-13	Como Administrador, quiero gestionar roles y permisos de usuario (Anónimo, Estudiante, Delegado, Ejecutiva, Administrador).	RF-14	Alta	5	Hecho	Sprint-01
HU-14	Como Usuario, quiero navegar el portal desde el móvil sin pérdida de funcionalidad.	RNF-02	Alta	8	Pendiente	Sprint-03
HU-15	Como Usuario, quiero que el sitio cumpla el nivel de accesibilidad WCAG 2.1 AA.	RNF-03	Media	8	Pendiente	Sprint-03
HU-16	Como Administrador, quiero buscar y filtrar contenido del panel por palabra clave y fecha.	RF-02, RF-15	Media	5	Pendiente	Sprint-03
HU-17	Como Administrador, quiero que los formularios estén protegidos frente a spam e inyección de datos.	RNF-04, RNF-08	Alta	5	Pendiente	Sprint-03
HU-18	Como Equipo, quiero configurar el tema base y la identidad visual institucional del CADUS.	RNF-02	Alta	5	Hecho	Sprint-01
HU-19	Como Administrador, quiero un panel de administración de contenidos (CRUD noticias/actas/delegaciones) restringido por rol.	RF-15	Alta	8	Hecho	Sprint-02
HU-20	Como Equipo, quiero optimizar el rendimiento (caché, imágenes) antes de la entrega final.	RNF-01, RNF-06	Media	5	Pendiente	Sprint-03
HU-21	Como Estudiante, quiero votar desde el portal en una convocatoria abierta (papeleta con YOP Poll).	RF-12, RN-05	Media	3	Cancelada	—
HU-22	Como Delegado, quiero dar de alta a mi sucesor cuando me doy de baja, para que la delegación no se quede sin cuenta.	RF-14, RN-04	Media	3	Pendiente	Sprint-03
HU-23	Como miembro de la Ejecutiva, quiero que los tickets y las mediaciones se borren o anonimicen a los 2 años de resolverse, para cumplir el plazo de conservación.	RNF-08, RN-03	Media	2	Pendiente	Sprint-03

4. Sprint backlog del Sprint 3

Sprint 3 (26/10 – 15/11/2026): 36 SP. Objetivo: dejar el portal terminado e implementado para el 15/11, como pidió el cliente: móvil y tablet, accesibilidad, formularios protegidos, buscar y filtrar en el panel, rendimiento, relevo de delegados y borrado a los 2 años.

Tabla 2. Sprint backlog del Sprint 3

Subtarea	Qué incluye	SP	Quién

HU-14a	Menús y portada en móvil y tablet	3	Joaquín
HU-14b	Directorio, tablas y fichas de delegación en móvil y tablet	3	Álvaro
HU-14c	Buzón, calendario y mediación en móvil y tablet, probados en dispositivos reales	2	Pablo
HU-15a	Contraste, foco visible, teclado y enlace «saltar al contenido»	3	Joaquín
HU-15b	Etiquetas de formularios, textos alternativos, encabezados, ARIA y lector de pantalla	3	Marcos
HU-15c	Daltonismo, pautas DUA, auditoría con Lighthouse y axe	2	Miguel Ángel
HU-16a	Filtros por palabra clave y fecha en noticias, actas y delegaciones	3	Álvaro
HU-16b	Búsqueda en tickets sin exponer datos del estudiante (RN-03)	2	Marcos
HU-17a	Honeypot y límite de envíos en el buzón y la mediación	3	Marcos
HU-17b	Revisión de saneamiento, nonces y escape; revisión de Wordfence	2	Pablo
HU-20a	Optimización de imágenes	2	Miguel Ángel
HU-20b	Caché y minificación; medición antes y después	3	Pablo
HU-22	El delegado da de alta a su sucesor, con efecto inmediato	3	Miguel Ángel
HU-23	Borrado o anonimización de tickets y mediaciones a los 2 años	2	Álvaro

Integrante	SP
Pablo	7
Joaquín	6
Miguel Ángel	7
Álvaro	8
Marcos	8
Total	36

Tabla 3. Puntos de control semanales

Semana	Historias	Pendiente al cerrar la semana
26/10 – 01/11	HU-14, HU-17, HU-22, HU-23 (18 SP)	18 SP
02/11 – 08/11	HU-15 (8 SP) y entrega del DMS	10 SP
09/11 – 15/11	HU-16, HU-20, despliegue, pruebas de aceptación y documentación final (10 SP)	0 SP

5. Burndown chart del Sprint 3

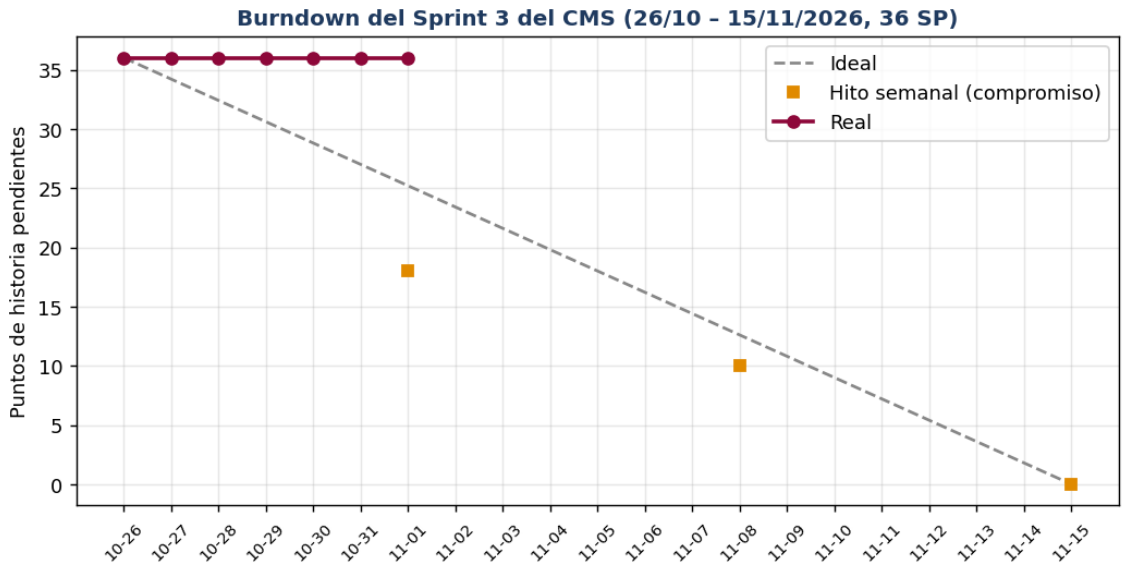


Figura 1. Burndown del Sprint 3 del CMS: línea ideal, hitos semanales y puntos pendientes reales.

A 01/11, fin de la semana 1, no hay ninguna historia cerrada en el GitHub Project (36 SP pendientes frente a los 18 SP comprometidos para esa fecha): el equipo va por detrás del hito y la semana 2 debe recuperarlo. La línea ideal es lineal; los hitos semanales (18 SP el 01/11 y 10 SP el 08/11) son el compromiso real del equipo, para no

repetir el cierre de última hora de los sprints 1 y 2. El burndown se actualiza cada día en docs/scrum/burndown/sprint-03.csv.

6. Implementación

Las capturas del portal son las de la entrega 2. El Sprint 3 acaba de empezar (planning el 26/10) y todavía no hay historias cerradas; las capturas de móvil, accesibilidad, relevo de delegados y rendimiento se añadirán al documento final del 15/11.

7. Riesgos

- El trabajo se deja para el final, como en los sprints anteriores: puntos de control semanales y burndown diario.
- El servidor SFTP de la US puede no ofrecer PHP y MySQL: se pregunta a la US antes del 30/10 (E3-03) y se reserva la semana 3 para desplegar y probar (E3-09).
- HU-14 y HU-15 tocan el mismo CSS: HU-15a empieza al cerrar HU-14a.
- El DMS y el CMS compiten por las mismas personas: el DMS se entrega el 08/11 con su propio reparto.
